

# BeStrong

## BeStrong or BeNothing

### Indice generale

|                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| Introduzione.....                                           | 2 |
| Obiettivi.....                                              | 2 |
| Obiettivi Generali:.....                                    | 2 |
| Obiettivi Specifici:.....                                   | 3 |
| Obiettivi Tecnici:.....                                     | 3 |
| Diagramma di Gantt.....                                     | 4 |
| Diagramma di Pert.....                                      | 4 |
| Charter di Progetto.....                                    | 5 |
| Analisi dei rischi.....                                     | 6 |
| 1. Ritardi nelle scadenze.....                              | 6 |
| 2. Conflitti interni nel team.....                          | 6 |
| 3. Difficoltà tecniche nell'integrazione del sistema.....   | 7 |
| 4. Problemi nella gestione dei dati sensibili.....          | 7 |
| 5. Problemi nel caricamento dei contenuti multimediali..... | 7 |
| 6. Problemi di compatibilità tra dispositivi.....           | 7 |
| Hardware e Software.....                                    | 7 |
| Spazio Online e Pubblicazione.....                          | 7 |
| Test e Collaudo.....                                        | 7 |
| Riserva per Rischi.....                                     | 8 |
| Ruoli.....                                                  | 8 |
| Conclusioni.....                                            | 8 |

# Introduzione

Questo documento descrive il progetto per lo sviluppo di un applicazione web che permetta la gestione delle schede dei clienti di una palestra.

Questo documento serve come input per la fase di progettazione e sviluppo del sistema, fornendo un documento di riferimento per tutte le figure coinvolte.

## Obiettivi

### Obiettivi Generali:

#### 1. Gestione degli utenti e delle schede allenamento:

- Permettere al personal trainer di creare e gestire account per i clienti.
- Creare, modificare e gestire le schede allenamento personalizzate per ciascun cliente, mantenendo uno storico delle schede passate.

#### 2. Gestione degli esercizi:

- Caricare, modificare e cancellare esercizi, associando ad ognuno le informazioni richieste (gruppo muscolare, obiettivo, difficoltà, descrizione, immagini/video).
- Implementare un sistema di filtraggio per gli esercizi in base a gruppo muscolare, obiettivo e difficoltà, facilitando la creazione di schede personalizzate.

#### 3. Monitoraggio dell'allenamento:

- Consentire ai clienti di visualizzare e modificare la propria scheda allenamento, con la possibilità di aggiornare i dettagli degli esercizi in tempo reale (ripetizioni, peso, tempo di esecuzione, ecc.).
- Fornire un'interfaccia per avviare l'allenamento, con timer per il tempo di esecuzione e recupero e navigazione tra gli esercizi.

## **Obiettivi Specifici:**

### **1. Creazione di account per clienti:**

- Progettare un sistema di gestione degli utenti che permetta la creazione, modifica e eliminazione degli account per i clienti da parte del personal trainer/admin.

### **2. Gestione dei macchinari in palestra:**

- Creare una sezione per la gestione dei macchinari presenti in palestra, consentendo ai trainer di associarli agli esercizi.

### **3. Design dell'interfaccia:**

- Progettare un'interfaccia utente semplice e intuitiva, con una visualizzazione chiara delle schede di allenamento e degli esercizi.
- Assicurarsi che l'app sia facilmente navigabile su dispositivi con schermi di dimensioni diverse.

### **4. Pagina "About" e 404 personalizzata:**

- Creare una pagina "About" con informazioni sul team di sviluppo, la descrizione del progetto e il significato del progetto.
- Progettare una pagina di errore 404 creativa (che compiacce l'occhio di Bassani) per migliorare l'esperienza utente in caso di errore di navigazione.

## **Obiettivi Tecnici:**


### **1. Database e gestione dei dati:**

- Creare una struttura di database robusta per gestire gli utenti, le schede, gli esercizi e i macchinari e mantenere lo storico delle schede.

### **2. Sicurezza e privacy dei dati:**

- Implementare sistemi di autenticazione e autorizzazione sicuri.

# Diagramma di Gantt

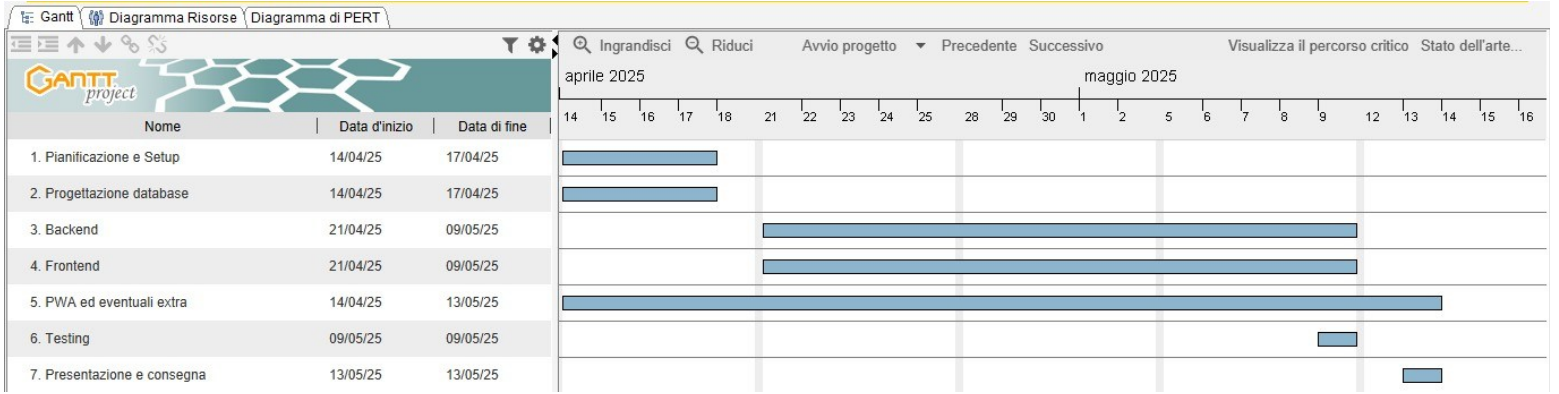

# Diagramma di Pert



# Charter di Progetto

|               |                              |            |      |
|---------------|------------------------------|------------|------|
| Nome progetto | <i>BeStrong or BeNothing</i> | Codice:    | 0001 |
| Data          | <i>14/04/2025</i>            | Revisione: | 0001 |

## Scopo del progetto e del prodotto:

Applicazione web per gestire le schede dei clienti in una palestra

## Obiettivi di progetto:

Sviluppare un applicazione web che permetta la gestione delle schede dei clienti di una palestra. La piattaforma dovrà permettere ai gestori della palestra di creare degli account per i loro clienti e delle schede per questi. Il cliente poi potrà vedere e eseguire la sua scheda mentre si allena venendo aiutato da un timer e un video sull'esercizio. Il cliente potrà modificare le informazioni riguardo al singolo esercizio.

## Requisiti di alto livello

- Pubblicizzazione della palestra e i suoi servizi.
- Individuazione di tutti gli esercizi.
- Esecuzione della scheda durante l'allenamento nel tempo prestabilito.

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Project Manager: | <i>Alberto Alessi</i>                                                              |
| Membri del team: | <i>Alberto Alessi, Matteo Cibotto, Nicola Grigoletto, Nicolò Perli, Nicola Zen</i> |
| Committente:     | <i>Palestra BeStrong</i>                                                           |
| Sponsor:         | <i>Itis E.Fermi</i>                                                                |

## Elenco degli stakeholder

Prof. Matteo Martini, Definisce tutti i requisiti del sistema da sviluppare.

Prof. Paolo Ambruoso, Utilizzatore finale.

Personal Trainer, Si occupa della gestione delle schede e interfacciarsi con i clienti.

Pubblicista, Si occupa dello studio della campagna pubblicitaria dell'applicazione.

## Tempistica preliminare - GANTT di alto livello

I tempi sono puramente indicativi per definire le date finali massime, oltre le quali il progetto potrebbe ridursi a un insuccesso oppure avere un aumento eccessivo dei costi.

## Prodotti principali - deliverables

- **Project management:** pianificazione del progetto (questo documento)
- **Avvio:** ricerca tutti i possibili esercizi
- **Progettazione:** valutazione delle risorse necessarie
- **Progettazione:** valutazione di una forma pubblicitaria
- **Esecuzione:** creazione sito web
- **Esecuzione:** sviluppo login back-end
- **Esecuzione:** streaming video esercizi
- **Esecuzione:** divisione logica cliente/personal trainer

| Schedulazione delle milestones  | Data consegna |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Pianificazione e setup       | 17/04/2025    |
| 2. Progettazione database       | 19/04/2025    |
| 3. Back-end                     | 9/05/2025     |
| 4. Front-end                    | 9/05/2025     |
| 5. PWA ed eventuali altri extra | TBD           |
| 6. Testing                      | 12/05/2025    |
| 7. Presentazione e consegna     | 13/05/2025    |

## Budget di massima

- Aperitivi 500 Euro
  - Benzina 100 Euro
  - Panini 500 Euro
  - Pubblicità 1000 Euro
- Totale budget di massima : 2100 Euro

#### **Rischi di alto livello**

- Ritardo nella consegna dell'applicazione
- Conflitti nel team
- Difficoltà interazione fe-be

#### **Approvazioni**

| Nome del Project Manager        | Nome del Committente           |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Alberto Alessi                  | Palestra BeStrong              |
| firma del Project Manager       | Firma del Committente          |
| <b>Alberto Alessi</b>           | <b>Palestra BeStrong</b>       |
| Lab. 3 Itis E.Fermi, 14/04/2025 | Lab.3 Itis E.Fermi, 14/04/2025 |

## Analisi dei rischi

### 1. Ritardi nelle scadenze

- **Descrizione del rischio:** La complessità tecnica del progetto, potrebbe comportare ritardi nelle fasi chiave del progetto, come lo sviluppo del back-end, l'integrazione del front-end.

### 2. Conflitti interni nel team

- **Descrizione del rischio:** Differenti opinioni, carichi di lavoro sbilanciati o malintesi tra i membri del team potrebbero rallentare il progresso del progetto o compromettere la qualità del lavoro.
- **Strategia di mitigazione:** Ogni membro del team avrà un ruolo e una responsabilità ben definiti, garantendo che tutti sappiano esattamente cosa ci si aspetta da loro. In caso di necessità, si ricorrerà a un mediatore (il Project Manager) per risolvere i conflitti.

### 3. Difficoltà tecniche nell'integrazione del sistema

- **Descrizione del rischio:** La gestione di diversi componenti, come il back-end, il front-end, potrebbe risultare complessa, con rischi di incompatibilità tra le diverse tecnologie o difficoltà nell'integrazione dei vari sistemi, in particolare nel flusso di dati tra il database e l'interfaccia utente.

### 4. Problemi nella gestione dei dati sensibili

- **Descrizione del rischio:** Poiché l'applicazione gestirà dati sensibili degli utenti (ad esempio, informazioni sugli allenamenti, dati personali dei clienti), potrebbero verificarsi violazioni della sicurezza o problemi legati alla privacy.
- **Strategia di mitigazione:** Verrà implementato un sistema di sicurezza robusto che includerà l'autenticazione sicura degli utenti e la crittografia dei dati sensibili.

### 5. Problemi nel caricamento dei contenuti multimediali

- **Descrizione del rischio:** L'integrazione di video e immagini per ogni esercizio potrebbe comportare difficoltà tecniche, come il rallentamento del caricamento della pagina o problemi di visualizzazione sui dispositivi degli utenti.
- **Strategia di mitigazione:** Per affrontare questo rischio, i contenuti multimediali saranno ottimizzati in termini di formato e dimensioni.

### 6. Problemi di compatibilità tra dispositivi

- **Descrizione del rischio:** L'applicazione potrebbe non funzionare correttamente su tutti i dispositivi e sistemi operativi, in particolare quelli più datati.
- **Strategia di mitigazione:** Verrà eseguito un testing approfondito su vari dispositivi, incluse diverse versioni di smartphone, tablet e desktop, per garantire che l'applicazione funzioni correttamente su tutte le piattaforme principali.

## Hardware e Software

Per lo sviluppo dell'applicazione BeStrong, è necessario disporre di una serie di risorse hardware e software. Il sistema deve essere testato su vari dispositivi (PC, tablet, smartphone) per garantire la compatibilità mobile. Per quanto riguarda il software, si utilizzeranno tecnologie moderne come HTML5, CSS3, JavaScript, Python e SQLite come sistema di gestione del database.

## Spazio Online e Pubblicazione

L'applicazione in futuro sarà pubblicata su una piattaforma di hosting cloud per garantire alta disponibilità e scalabilità. Il dominio della palestra sarà associato al sito web per migliorarne l'accessibilità e la visibilità online.

## Test e Collaudo

La fase di testing sarà cruciale per garantire che tutte le funzionalità siano implementate correttamente e che l'applicazione sia priva di bug. Durante il periodo di testing, saranno eseguiti test funzionali, di usabilità, di compatibilità (su vari dispositivi), e di performance. Il collaudo includerà il controllo della sicurezza dei dati, la corretta gestione degli utenti, e la stabilità del sistema. Il testing inizierà il 12 maggio 2025 e si concluderà con una fase di feedback che permetterà di ottimizzare l'applicazione prima della presentazione finale.

# Riserva per Rischi

I rischi identificati per questo progetto includono ritardi nelle scadenze, conflitti interni nel team, difficoltà tecniche nel garantire la compatibilità tra front-end e back-end, e problemi nella gestione dei dati sensibili degli utenti. Per mitigare questi rischi, è stato pianificato un buffer di tempo per ogni fase, in modo da poter intervenire tempestivamente in caso di imprevisti.

## Ruoli

Il team di sviluppo è composto dal Project Manager Alberto Alessi, che supervisionerà l'andamento del progetto e gestirà la comunicazione con il committente. I membri del team, Matteo Cibotto e Nicola Zen si occuperanno del front-end, mentre Nicola Grigoletto, Nicolò Perli e Alberto Alessi, si occuperanno delle attività di sviluppo back-end, e gestione dei dati. Il Personal Trainer, come utilizzatore finale, avrà un ruolo attivo nel fornire feedback sui requisiti funzionali. Inoltre, il Pubblicista contribuirà alla creazione di una campagna di marketing per promuovere l'applicazione.

## Conclusioni

BeStrong rappresenta un'opportunità per migliorare l'efficacia e la gestione degli allenamenti in palestra, offrendo sia ai personal trainer che ai clienti un'applicazione web facile da usare e altamente funzionale. Il progetto si basa su un'accurata analisi dei requisiti, la gestione di un team competente e l'adozione di tecnologie moderne per garantire una buona esperienza utente. Con un piano di sviluppo ben definito e una strategia di testing e collaudo, ci si aspetta di consegnare il progetto nei tempi previsti, rispettando il budget e soddisfacendo le esigenze del committente.
